แบบฟอร์มการตรวจประเมินสภาพฝาย

โครงการพัฒนาระบบการสำรวจและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง
ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 1)
โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

****

รหัสหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 9 รหัสตำบล 0 0 0 0 0 0 0 7 รหัสอำเภอ 0 0 0 0 0 3 รหัสจังหวัด 0 0 5 2

รหัสฝาย : WPH030700901

ผู้ตรวจสอบ ทีมตรวจประเมิน วัน/เดือน/ปี 16 มิถุนายน 2568 ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ หน่วยงาน CMU

ตำแหน่งที่ ชื่อฝาย ห้วยแกงแกะ 1 ชื่อลำน้ำ แกงแกะ ลำน้ำสาขาของ แม่จอก/ยม

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2553 อายุฝาย 15 ☐ ออกแบบเอง ☑ ใช้แบบมาตราฐาน มข.2527 .

☐ ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ

หน่วยงานรับผิดชอบ ☐ หน่วยงานตามภารกิจ

☑ หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง รับถ่ายโอนมาจาก -

☐ อื่นๆ

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 ประเภทลำน้ำ

☐ แม่น้ำสายหลัก ☐ แม่น้ำสาขา ☑ ลำห้วย ☐ ลำเหมือง

1.2 ที่ตั้งพิกัดฝายที่ตรวจสอบ

หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่ปากจอก ตำบล ทุ่งแล้ง จังหวัด แพร่

พิกัด X (UTM) 5 8 0 7 5 8 พิกัด Y (UTM) 1 9 8 4 0 7 3

1.3 ประเภทของสันฝาย

☑ ฝายสันมน ☐ ฝายไหลตกตรง ☐ ฝายสันกว้าง ☐ ฝายหินทิ้ง ☐ ฝายประตูระบาย ☐ อื่นๆ

ความสูงสัน 2.0 เมตร ความกว้างสัน 15.0 เมตร

1.4 ประตูระบายน้ำ/ระบายทราย ☑ มี ☐ ไม่มี

ชนิดบานประตู ☑ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) 2.0*2.0 เมตร จำนวน 2 ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☑ มี ☐ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☑ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.5 อาคารบังคับน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

☐ แบบปิด ☐ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

ขนาดฝาท่อปิด เมตร ความยาวท่อ เมตร ระดีบธรณีประตู เมตร

☐ แบบเปิด ☐ ฝั่งซ้าย ☑ ฝั่งขวา

บานประตู ☑ มี ☐ ไม่มี

☑ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) 1.0*1.0 เมตร จำนวน 1 ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☑ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.6 พื้นที่รับประโยชน์ ด้านการเกษตร ประมาณ 1200 ไร่ ด้านอุปโภคบริโภค ประมาณ - ครัวเรือน

2. ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

ลักษณะคลอง ☑ คลองดิน ☐ คลองดาดคอนกรีต

ขนาดกันคลองกว้าง 1.0 เมตร ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร

3. ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

4. การตรวจสภาพฝาย

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
1. ส่วน Potection เหนือน้ำ (Upstream Protection Section) ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
1.1 พื้น (floor)	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☑ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☑ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
1.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง									✓		อื่นๆ
	มาก											
2. ส่วนเหนือน้ำ (Upstream Concrete Section) ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
2.1 พื้น (floor)	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☑ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☑ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
2.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง				✓					✓		อื่นๆ
	มาก											
3. ส่วนควบคุม (Control Sector) ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
3.1 ฝายควบคุมน้ำและบันไดปลา	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย									✓		☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.2 กำแพงข้าง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย									✓		☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3 ประตู/ช่องระบายทราย												
3.3.1 พื้น	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☑ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
3.3.2 กำแพงข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.3 ประตูระบายน้ำเฉพาะตัวบาน	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย				✓					✓		☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.4 ประตูระบายน้ำเคลื่องกล/อุปกรณ์	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		☐ ไม่มี
	น้อย				✓							☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.5 ท่อนกันน้ำและร่องบาน	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.4 แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย				✓					✓		☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.5 สะพาน	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
4. ส่วนท้ายน้ำ (Downstream Concrete Section) ☑ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่												
4.1 พื้น (floor)	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☑ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☑ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
4.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง									✓		อื่นๆ
	มาก				✓							
4.3 ฟันตะเข้	ปกติ		✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย	✓			✓					✓		☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
4.4 แผงปะทะด้านท้ายน้ำ	ปกติ											☐ ไม่มี
	น้อย	✓			✓					✓		☑ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
5. ส่วน Protection ท้ายน้ำ (Downstream Protection Section) ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
5.1 พื้น (floor)	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☑ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☑ มาก	มาก											
5.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
6. ระบบส่งน้ำ ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
6.1 พื้น (floor)	ปกติ		✓	✓			✓	✓	✓			☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย	✓			✓							☐ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก					✓				✓		
6.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก				✓					✓		
6.3 ประตูน้ำ/ปากคลอง	ปกติ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก									✓		

5. แผนการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงาน

☐ อยู่ในแผน ..... ปี ลักษณะโครงการ ..... งบประมาณ ..... บาท

☐ ได้รับงบประมาณแล้ว ..... บาท ลักษณะโครงการ .....

☐ กำลังปรับปรุงหรือก่อสร้าง ☑ ยังไม่มีในแผน

6. ความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม

ฝายมีสภาพโครงสร้างแข็งแรง

พร้อมด้วยระบบส่งน้ำแบบลำเหมืองเปิดด้านขวาที่ติดตั้งบานประตูสำหรับการควบคุมการเปิด–ปิดน้ำเพื่อการกระจายและจัดสรรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริเวณลำเหมืองส่งน้ำมีการสะสมของวัชพืชหนาแน่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลและลดทอนประสิทธิภาพการส่งน้ำ จึงควรได้รับการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพการใช้งานของระบบส่งน้ำในระยะยาว

7. รูปประกอบ

1.ส่วน Protection เหนือน้ำ




2.ส่วนเหนือน้ำ



3.ส่วนควบคุม



4.ส่วนท้ายน้ำ

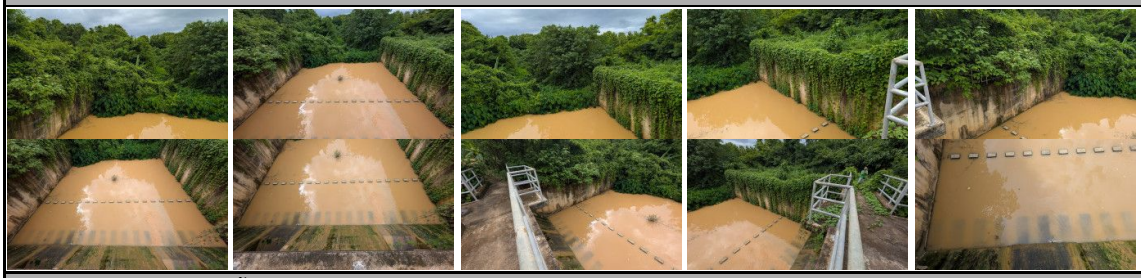

5.ส่วน Protection ท้ายน้ำ



6.ระบบส่งน้ำ

