แบบฟอร์มการตรวจประเมินสภาพฝาย

โครงการพัฒนาระบบการสำรวจและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง
ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 1)
โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

****

รหัสหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 3 รหัสตำบล 0 0 0 0 0 0 0 6 รหัสอำเภอ 0 0 0 0 0 6 รหัสจังหวัด 0 0 5 2

รหัสฝาย : WPH060600307

ุ่ตรวจสอบ ทีมตรวจประเมิน วัน/เดือน/ปี 29 พฤษภาคม 2568 ตำแหน่ง - หน่วยงาน CMU

ำแหน่งที่ ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ จำเลา ลำน้ำสาขาของ แม่ปุ/แม่น้ำยม

่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย ☑ ออกแบบเอง ☐ ใช้แบบมาตราฐาน .

☐ ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ

หน่วยงานรับผิดชอบ ☐ หน่วยงานตามภารกิจ

☐ หน่วยงานท้องถิ่น รับถ่ายโอนมาจาก

☑ อื่นๆ

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 ประเภทลำน้ำ

☐ แม่น้ำสายหลัก ☐ แม่น้ำสาขา ☑ ลำห้วย ☐ ลำเหมือง

1.2 ที่ตั้งพิกัดฝายที่ตรวจสอบ

หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านป่าเลา ตำบล สะเอียบ จังหวัด แพร่

พิกัด X (UTM) 6 3 0 7 3 9 พิกัด Y (UTM) 2 0 6 0 0 7 4

1.3 ประเภทของสันฝาย

☑ ฝายสันมน ☐ ฝายไหลตกตรง ☐ ฝายสันกว้าง ☐ ฝายหินทิ้ง ☐ ฝายประตูระบาย ☐ อื่นๆ

ความสูงสัน 1.00 เมตร ความกว้างสัน 15.00 เมตร

1.4 ประตูระบายน้ำ/ระบายทราย ☑ มี ☐ ไม่มี

ชนิดบานประตู ☑ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) 1.00*0.70 เมตร จำนวน 1 ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☐ มี ☑ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☐ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.5 อาคารบังคับน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

☐ แบบปิด ☐ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

ขนาดฝาท่อปิด เมตร ความยาวท่อ เมตร ระดีบธรณีประตู เมตร

☑ แบบเปิด ☑ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

บานประตู ☐ มี ☑ ไม่มี

☐ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) เมตร จำนวน ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☐ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.6 พื้นที่รับประโยชน์ ด้านการเกษตร ประมาณ ไร่ ด้านอุปโภคบริโภค ประมาณ ครัวเรือน

2. ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

ลักษณะคลอง ☑ คลองดิน ☐ คลองดาดคอนกรีต

ขนาดกันคลองกว้าง 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 0.50 กิโลเมตร

3. ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

4. การตรวจสภาพฝาย

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
1. ส่วน Potection เหนือน้ำ (Upstream Protection Section) ☐ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่												
1.1 พื้น (floor)	ปกติ											☑ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☐ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☑ มาก	มาก											
1.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
2. ส่วนเหนือน้ำ (Upstream Concrete Section) ☐ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่												
2.1 พื้น (floor)	ปกติ											☑ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☐ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☑ มาก	มาก											
2.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3. ส่วนควบคุม (Control Sector) ☐ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☑ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่												
3.1 ฝายควบคุมน้ำและบันไดปลา	ปกติ											☐ ไม่มี
	น้อย				✓				✓			☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		อื่นๆ
	มาก											
3.2 กำแพงข้าง	ปกติ											☐ ไม่มี
	น้อย				✓				✓			☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		อื่นๆ
	มาก											
3.3 ประตู/ช่องระบายทราย												
3.3.1 พื้น	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย											☐ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง											อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
3.3.2 กำแพงข้าง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		☐ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.3 ประตูระบายน้ำเฉพาะตัวบาน	ปกติ										ใช้แผ่นไม้	☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.4 ประตูระบายน้ำเคลื่องกล/อุปกรณ์	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.3.5 ท่อนกันน้ำและร่องบาน	ปกติ											☐ ไม่มี
	น้อย											☑ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.4 แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
3.5 สะพาน	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											
4. ส่วนท้ายน้ำ (Downstream Concrete Section) ☐ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☑ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่												
4.1 พื้น (floor)	ปกติ											☐ ไม่มี
ตะกอน	น้อย				✓				✓			☐ มองไม่เห็น
☐ ปกติ ☑ น้อย	ปานกลาง	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		อื่นๆ
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
4.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☐ ไม่มี
	น้อย				✓				✓			☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		อื่นๆ
	มาก											
4.3 ฟันตะเข้	ปกติ											☑ ไม่มี
	น้อย											☐ มองไม่เห็น
	ปานกลาง											อื่นๆ
	มาก											

องค์ประกอบ		ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา										
		การกัดเซาะ	การทรุดตัว	การแตกร้าว	สิ่งกีดขวาง	รูโพรง	การรั่ว	การเคลื่อนตัว	การระบายน้ำ	ต้นไม้/วัชพืช	ขนาดความเสียหาย	หมายเหตุ
4.4 แผงปะทะด้านท้ายน้ำ	ปกติ											☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
	น้อย											
	ปานกลาง											
	มาก											
5. ส่วน Protection ท้ายน้ำ (Downstream Protection Section) ☐ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
5.1 พื้น (floor)	ปกติ											☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
ตะกอน	น้อย											
☐ ปกติ ☑ น้อย	ปานกลาง											
☐ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
5.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ											☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
	น้อย											
	ปานกลาง											
	มาก											
6. ระบบส่งน้ำ ☐ **ใช้งานได้** ☑ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่**												
6.1 พื้น (floor)	ปกติ			✓	✓	✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
ตะกอน	น้อย	✓	✓									
☐ ปกติ ☐ น้อย	ปานกลาง									✓		
☑ ปานกลาง ☐ มาก	มาก											
6.2 ลาดด้านข้าง	ปกติ			✓	✓	✓	✓	✓	✓			☐ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
	น้อย	✓	✓									
	ปานกลาง									✓		
	มาก											
6.3 ประตูน้ำ/ปากคลอง	ปกติ											☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ
	น้อย											
	ปานกลาง											
	มาก											

5. แผนการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงาน

☐ อยู่ในแผน ..... ปี ลักษณะโครงการ ..... งบประมาณ ..... บาท

☐ ได้รับงบประมาณแล้ว ..... บาท ลักษณะโครงการ .....

☐ กำลังปรับปรุงหรือก่อสร้าง ☑ ยังไม่มีในแผน

6. ความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม

7. รูปประกอบ


1.ส่วน Protection เหนือน้ำ

2.ส่วนเหนือน้ำ

3.ส่วนควบคุม



4.ส่วนท้ายน้ำ

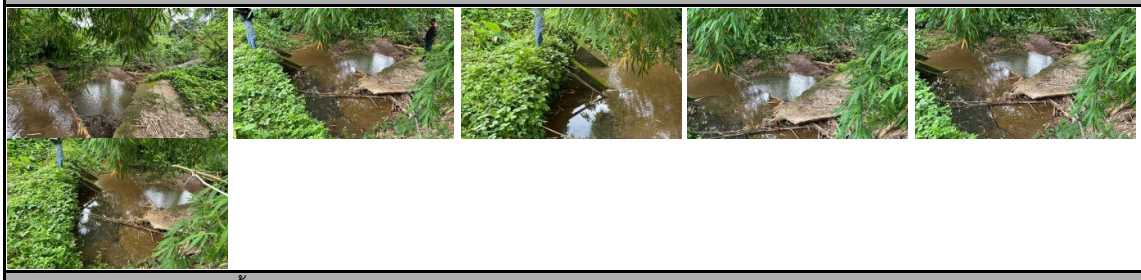

5.ส่วน Protection ท้ายน้ำ

6.ระบบส่งน้ำ

